INCHEON CREATIVE DESIGN SOCIAL EXPERIMENT · 2026

ACT Incheon

인천 도시실험 통합브랜드 · 함께 만드는 도시의 변화, 선순환의 인천

인천 창의디자인 사회실험 보고서


사회실험 보고서 포맷(안) · 앞단(I · II) + 굴포천 거점 + 향후계획

4개 분야 · 7개 거점 · 사전조사 → 1차 → 2차 비교 실험 · 1개소 고정 구현 · 2026. 5 ~ 12

A Active
사람들을 움직이게 하는 활력

C Connective
주체들을 단단하게 묶는 연결

T Transformative
도시의 선순환을 만드는 변화



"함께 만드는 도시의 변화, 선순환의 인천"

행정이 제도적 플랫폼을 제공하고, 기업이 재원과 자원을 투입하며, 시민의 주도적 참여로 도시를 움직이는 선순환 구조 — 로컬 중심 거버넌스의 첫 사회실험 모델



발주기관 인천광역시

수행기관 주식회사 위즈플러스

2026. 11.

ACT INCHEON

본 보고서는 공공디자인 심의도서(2026. 11)의 앞단(I 개요 및 사회실험 · II 사업방향)과 굴포천 [매력 ⑤] 실험을 A4 책자형으로 재구성한 보고서 포맷안이다. 국내외 임시 설치(Tactical Urbanism) 시범사업 평가보고서의 체계(배경 → 방법 → 실험 설계 → 측정 지표 → 운영 → 후속 판단)를 따랐다.

인천 창의디자인 사회실험 사업

사회실험 보고서 · 보고서 포맷(안)

발주기관	인천광역시
수행기관	주식회사 위즈플러스
발행	2026. 11.
브랜드	ACT Incheon · Active · Connective · Transformative

CONTENTS

목 차

보고서
구성

A4 책자형 31쪽 · 앞단(I·II)
+ 굴포천 1개 거점 +
향후계획

요약

한눈에 보기 · 보고서 구성 원칙 4

I. 개요 및 사회실험

01 패러다임 변화 · 02 사업 개요 8

03 주요 과업 · 04 사회실험의 의의 9

05 사회실험 개념 · 06 5단계 방법 프로세스 10

07 조사체계 · 08 추진경과 로드맵 11

II. 사업방향

01 사업 당위성 · 02 대상지 선정 14

03 3S 전략 · 4개 분야 · 04 사회실험 원칙 15

05 사전기획 과정 · 06 현장조사 · 07 현황 종합 16

08 컨셉 도출 · 7개 거점 분포 · 협업 구조 17

III. 거점별 세부계획

01 전체 실험 요약(7개 거점) 20

06 굴포천 ① 거점 개요 · 핵심 문제 지표 · 가설 21

06 굴포천 ② 사전기획과 실험 연결 · 설치 위치 22

06 굴포천 ③ 1차 실험「흐르는 인천」 23

06 굴포천 ④ 2차 실험「함께 만드는 인천」 24

06 굴포천 ⑤ 설치 품목 · 동일 조건 운영 · 안전 기준 25

IV. 향후계획

01 운영 · 일정 · 조건 관리 28

02 운영 절차 · 종료 후 판단 · 03 표준 매뉴얼 29

참고 자료

국내외 참고 보고서 · 문헌 30

요약 00

한눈에 보기

인천 창의디자인 사회실험 사업 · 한눈에 보기

작게 구현하고, 실제 이용을 확인하고, 검증된 거점을 고정 시설로 잇는 사업

4 개 분야
안전 · 포용 · 매력 · 편의

7 개 거점
약산초 · 선인재단 · 송도 · 차이나타운 · 굴포천 · 로데오거리 · 연안여객터미널

2 회 비교 실험
사전조사 → 1차 → 2차 · 동일 조건

1 개 고정 구현
검증 거점 1개소 고정시설 설계

사업 개요

구분	내용
사업명	인천 창의디자인 사회실험 사업
사업 기간	2026. 5. 15. ~ 12. 30. (착수 → 현장조사 → 1·2차 사회실험 → 결과분석 → 고정시설 구현 · 보고서)
예산	410,000,000원
과업 범위	4개 분야(안전·포용·매력·편의) 7개 거점의 임시 설치 사회실험과 1개소 고정 구현, 표준 매뉴얼 제작
추진 체계	인천광역시(총괄) · 위즈플러스(PM·조정·점검) · 시민디자인단 · 청년작가 · 관계부서 · 민간기업(3M) · 사회적협동조합(이소)

실험 과정 · 모든 거점 공통

현장조사 평일·주말, 낮·밤 전수 관찰 → **사전조사** 요일·시간대 기준값 측정 → **1차 실험** 하드웨어 설치 · 반응 관찰 → **2차 실험** 소프트웨어·참여 추가 · 비교 → **해석·반영** 목표값 교차 분석 · 설계 보완

요약 00

한눈에 보기

(계속)

굴포천 실험 요약 · [매력 ⑤] 제1교량 옆 산책로

항목	내용
문제	복원 직후 방문 목적 1위가「휴식」(35%)이나 산책로에 그늘과 앉을 자리가 없음 · 유일한 그늘인 교량 하부에 체류 집중(평균 약 20분)
1차「흐르는 인천」	교량 양쪽 파라솔 8개 + 인천대 스툴 · 빈백 16 · 책 · 소리 · 향으로 그늘과 자리 제공 · 11.15(일)~16(월)
2차「함께 만드는 인천」	1차 시설물 그대로 + 청년작가 2명·시민·인천대 4팀 스툴 꾸미기 워크숍 · 11.22(일) 13~15시
목표 데이터	그늘 아래 체류 인원·시간이 교량 하부(대조군) 대비 1.5배 · 멈춤률 10% 이상 · 참여 인원·재방문·1차 대비 체류
동일 조건	10.17 사전조사와 같은 요일·시간대 · 오전·오후 각 1시간 · 교량 하부와 동시 계수 · 관찰 3인 이내

핵심 일정 · 2026

5월 — 과업 착수 · 착수보고회

6 ~ 8월 — 현장조사 · 포럼 · 시민디자인단 워크숍

9월 — 1차 중간보고 · 관계부서 협의

10 ~ 11월 — 공공디자인 심의 · 1 · 2차 사회실험(ACT WEEK)

12월 — 결과분석 · 고정 구현 · 최종보고

보고서 구성 원칙 · 국내외 시범사업 평가보고서 참고

① 배경·문제 정의 → 방법 → 실험 설계 → 측정 지표 → 운영 → 후속 판단의 순서(LA People St 평가 매뉴얼, NZTA Innovating Streets 평가 체계) ② 사전·사후 및 대조군 비교와 동일 조건 기록(NJ Evaluating Tactical Urbanism) ③ 거점별 1쪽 요약 카드(가설·대상·방법·목표 데이터·일정·관계기관) ④ 결과는 계획값·목표값·측정값을 구분해 기록(서울 디자인거버넌스·인천연구원 5단계 프로세스).

CHAPTER 01

01

개요 및 사회실험

OVERVIEW · SOCIAL EXPERIMENT

만들어 놓는 디자인에서 시민과 함께 실험하고 확인하는 디자인으로. 작게 설치하고, 실제 이용을 관찰 · 계수하고, 검증된 안을 고정 시설과 표준 매뉴얼로 잇는 인천형 사회실험의 틀을 정리한다.

01 공공디자인 패러다임 변화 8

02 사업 개요 8

03 주요 과업 9

04 사회실험의 의의 9

05 사회실험 개념 프로세스 10

06 5단계 방법 프로세스 10

07 사회실험 조사체계 11

08 추진경과 로드맵 12

이 장의 핵심

- 4개 분야 · 7개 거점 · 2회 비교 실험 · 1개소 고정 구현
- 기획 → 적용 → 기록 → 해석 → 설계 반영의 5단계
- 통계 · 문헌과 현장조사를 잇는 조사체계

I - 01

공공디자인
패러다임 변화

공공디자인 패러다임의 변화

만들어 놓는 디자인에서, 시민과 함께 실험하고 확인하는 디자인으로

BEFORE	TRANSITION	NOW	NEXT
설치 중심	**참여 중심**	**실험 중심**	**확산 중심**
시설물·경관 중심의 공급형 공공디자인. 완성 후 이용 여부를 확인하기 어려움	시민 참여·디자인 거버넌스 확대. 의견은 모이지만 현장 검증은 부족	작게 설치하고 실제 이용을 관찰·계수해 효과를 확인하는 사회실험	검증된 안을 고정 시설·표준 매뉴얼로 연결, 다른 생활권으로 확산

인천광역시는 공공디자인을 「설치하는 것」에서 「시민의 실제 이용으로 확인하는 것」으로 전환하고 있다. 본 사업은 인천형 창의디자인 3S 전략(Sustainable · Social · Scalable)에 따라 4개 분야 7개 거점에서 가역적 설치와 관찰로 설계 조건을 검토하고, 확대 여부를 효과 · 관리 · 비용으로 판단한다.

I - 02

사업 개요

사업 개요

인천의 생활 조건에서 실험하고, 결과를 다음 설계와 운영에 연결함

구분	내용
사업명	인천 창의디자인 사회실험 사업
목적	시민 아이디어를 작게 실험하고 실제 이용으로 판단할 근거를 확보 · 공공디자인 진흥계획 재정비와 후속 설계에 쓸 현장 실증 자료 축적
기간	2026. 5. 15. ~ 2026. 12. 30.
예산	410,000,000원
과업 범위	안전 · 포용 · 매력 · 편의 4개 분야 7개 거점 사회실험 + 1개소 고정 구현
주요 내용	기초·현장조사 → 협업체계 구축(시민디자인단·청년작가) → 사회실험 디자인·세부계획 → 관계기관·민간기업 협의 → 1·2차 사회실험 → 결과 분석 → 고정시설 실시설계·구현 → 보고서·표준 매뉴얼
브랜드	ACT Incheon (Active · Connective · Transformative)

※ 거점 : 약산초(안전) · 선인재단(안전) · 송도 캠퍼스타운역 일대(포용) · 차이나타운(포용) · 굴포천(매력) · 로데오거리(편의) · 연안여객터미널(편의)

주요 과업

조사 · 실험 · 확산의 세 축으로 과업을 구성

❶ 조사·기획

· 통계·문헌·지역 이슈 기반 데스크리서치
· 7개 거점 현장조사(평일·주말·낮·밤)
· 거점별 가설·지표 수립 · 사전기획

❷ 사회실험 실행

· 1차 하드웨어 설치 · 2차 소프트웨어·참여 추가
· 사전조사와 동일 조건에서 관찰·계수·설문
·
관계기관·민간기업·시민디자인단 협업

❸ 검증·확산

· 계획값·목표값·측정값 비교 분석
· 1개소 고정시설 실시설계·구현
· 표준 매뉴얼(기획·설계·운영·관리) 제작

과업 항목

1. 기초조사 및 현장조사
2. 협업체계 구축(시민디자인단 · 청년작가)
3. 사회실험 디자인 · 세부계획 수립
4. 관계기관 · 민간기업 협의
5. 사회실험 준비 · 홍보
6. 1차 · 2차 사회실험 운영
7. 사회실험 결과분석
8. 고정시설 실시설계 및 구현
9. 사회실험 보고서 및 성과물 제작

사회실험의 의의

「맞는 옷」을 찾는 과정 · 작게 시도하고, 확인하고, 되돌릴 수 있는 디자인

Evidence
실증
계획이 아니라 실제 이용(체류 · 시선 · 이동 · 응답)으로 효과를 확인한다.

Reversible
가역성
당일 설치 · 철수를 원칙으로, 실패 비용을 줄이고 수정 이유를 기록한다.

I - 04

사회실험의 의의

(계속)

Participation

참여

시민디자인단 · 청년작가 · 학생이 관찰 · 제작 · 평가에 함께한다.

Scalable

확산

검증된 안을 고정 시설과 표준 매뉴얼로 연결해 다른 생활권에 적용한다.

국내외 시범사업(Pilot · Tactical Urbanism) 평가의 공통점은 「짧게 설치 → 전·후 및 대조 구간 비교 → 지표로 판단 → 영구화 여부 결정」이다. 본 사업도 같은 구조를 따르되, 거점별 생활 조건(통학로 · 하천 · 항만 · 상권)에 맞춰 지표를 달리 설계했다.

I - 05

사회실험 개념 프로세스

사회실험 개념 프로세스

도시에 「맞는 옷」을 찾는 세 단계

STEP 01

입어 보기

거점의 문제와 이용자를 읽고, 가설과 지표를 세운 뒤 작게 설치한다.

STEP 02

확인하기

사전조사와 같은 조건에서 관찰 · 계수 · 설문으로 변화를 확인한다.

STEP 03

맞춰 입기

효과 · 관리 · 비용으로 판단해 보완하고, 고정 시설과 매뉴얼로 잇는다.

I - 06

사회실험 방법 프로세스

5단계 방법 프로세스

기획 → 적용 → 기록 → 해석 → 설계 반영 (출처 : 인천연구원 사회실험 프로세스 재구성)

1

기획

물리적 환경과 이용자의 숨은 니즈를 파악하여 현장에서 검증할 핵심 가설과 측정 지표 설계

2

적용

기획된 디자인 솔루션을 실제 공간에 임시 설치하고 거점별 통제 변인에 맞춰 시범 운영

I - 06

사회실험 방법 프로세스

(계속)

3 기록

운영 기간 동안 발생하는 이용자의 주관적 의견과 객관적 행동 데이터를 다각도 수집

4 해석

수집된 데이터를 목표값과 교차 분석하여 가설을 검증하고 실효성 있는 보완 근거 도출

5 설계 반영

검증된 인사이트를 최종 디자인안에 적용하고 유지관리 책임을 포함한 표준화 매뉴얼 완성

거점별 통제 변인 · 공통 기록 항목

장소 · 시간 · 날씨 · 운항 · 행사 · 대상 집단의 거점별 차이를 함께 기록하여 동일 요소 · 동일 가설 조건에서 비교한다.
바뀐 요소(그림 · 언어 · 조명 · 그늘 · 사인 · 콘텐츠)와 바뀌지 않은 조건을 구분해 적는다.

I - 07

사회실험 조사체계

사회실험 조사체계

통계와 이론으로 맥락을 읽고, 현장에서 실제 이용을 확인함

01 데스크리서치

문헌 · 통계 등 기존 자료를 체계적으로 수집 · 분석하여 사회문제의 배경과 범위 파악. 규모 · 대상 · 이론적 근거를 정리하고 출처 · 기준연도 · 조사대상을 함께 기록

02 실제 현장조사

실제 이용 행태와 공간의 맥락을 직접 관찰 · 기록하여 데스크리서치의 가설을 검증하고 구체화. 조사 일시 · 관찰 구간 · 이용 행태 · 인터뷰를 수립된 가설 기반으로 체계적으로 수행

조사 유형	주요 자료
통계분석	인천광역시 사회조사 · 국가통계데이터포털 · 읍면동 단위 행정 통계 · 인구 · 이용 · 환경 현황 데이터
선행연구 · 문헌	관련 연구보고서 및 학술 논문 · 국내외 유사 사례 및 이론 · 관련 서적 및 간행물
보도자료 · 이슈	언론 보도자료 · 사회적 및 지역 이슈 · 최신 트렌드 동향
상위 · 유관계획	상위계획 및 유관 계획 · 민선 9기 시정 정책 · 최근 시책사업 · 유사 규모 타 지자체 계획
현장조사	평일 · 주말, 낮 · 밤 관찰(7개 거점 전체) · 이용 행태 계수 · 보행자 설문 · 인터뷰 · 사진 기록

I - 07

사회실험 조사체계

(계속)

조사 기반 이슈 도출

통계 · 문헌 · 지역 현안 · 상위계획 기반 핵심 이슈와 문제점 도출

→

거점별 기획 방향 수립

이슈 기반 거점별 목표 · 전략, 검증 지표 수립

→

1차 실험 시범 적용

우선 적용 가능한 실험안 설계 · 전략 검증 · 피드백

→

2차 실험 비교 · 보완

검증 결과와 현장 반응으로 계획 보완 · 최종 계획 수립

I - 08

추진경과 로드맵

추진경과 로드맵

조사 · 협의 · 시민참여의 과정을 통해 사회실험의 실행을 연결하는 단계별 추진 과정

- **06~08** 현장조사
  · 7개 거점 평일·주말·낮·밤
- **06.25** 창의디자인 포럼
- **08.05** 시민디자인단 워크숍
- **09.11** 중간보고
- **09.18** 관계부서 협의
- **09.30** 시민디자인단 자문
- **10.02** 전문가 자문
- **10.06~** 1차 사회실험 개시
  · 약산초부터 순차
- **11월** 1·2차 사회실험
  · 7개 거점 · ACT WEEK
- **12월** 결과분석 · 고정 구현
  · 최종보고 · 매뉴얼

01 기초조사 · 현장조사
사회문제 · 이용자 · 공간의 조건 정리

02 포럼 · 시민참여
시민디자인단 · 이해관계자 의견 수렴

03 주요 보고 · 기획 조정
국장보고 · MP 자문 · 기획안 1~4차 보완

04 관계부서 협의
대상 범위 · 설치 · 운영 조건 검토

05 1차 사회실험
요소와 이용자 반응 관찰

06 2차 사회실험
비교 · 보완 · 최종안의 경험 확인

07 고정 구현 · 매뉴얼
검증 근거를 설계 · 관리 · 확산으로 연결

CHAPTER 02

02

사업방향

PROJECT DIRECTION

정책 · 현장 · 시민의 요구를 연결해 실험의 방향을 정한다. 7개 거점의 선정 근거, 3S 전략과 4개 분야, 사회실험 원칙, 사전 기획과 현장조사, 그리고 모든 실험을 감싸는 통합브랜드 「ACT Incheon」.

01 사업 당위성 14

02 대상지 선정 14

03 3S 전략과 4개 분야 15

04 사회실험 원칙 15

05 사전 기획 과정 16

06 사전 현장조사 16

07 현황 종합 17

08 컨셉 도출 · ACT Incheon 17

이 장의 핵심

- Sustainable · Social · Scalable
- 안전 · 포용 · 매력 · 편의
- 같은 측정 체계, 거점별 조건에 맞는 방법

II - 01

사업 당위성

사업 당위성

공공디자인 정책 · 진흥계획 · 현장 문제를 연결해 시민의 실제 이용을 확인하는 실증 자료를 만듦

조사 ① 정책 여건

창의디자인 사회실험 추진 · 인천형 3S 전략

안전 · 포용 · 매력 · 편의 4개 분야 8개소 내외로 추진하며 시민 · 청년작가가 참여. 작게 구현하고 실제 이용을 확인해 확대 여부를 효과 · 관리 · 비용으로 판단
→ 시민 아이디어를 작게 실험하고 실제 이용으로 판단할 근거가 필요함

조사 ② 계획 · 선행연구

공공디자인 진흥계획 재정비 추진

사전 · 1차 · 2차 비교에서 관찰 단위 · 응답 분모 · 비교 조건을 먼저 정하고 디자인 효과와 외부 조건을 구분. 인지 · 체류 · 행동과 체감 만족을 함께 기록
→ 계획 · 설계 · 관리 검토에 활용할 현장 실증 자료가 필요함

조사 ③ 지역 조건

거점의 생활 조건을 직접 관찰

통학로 · 수변공간(약산초 · 선인 · 굴포천), 항만 · 관광 · 유학생 생활권(터미널 · 차이나타운 · 송도), 상업가로(로데오거리)의 실제 이용 조건을 확인
→ 지역에 맞는 적용 근거를 확보함

인천의 생활 조건을 살피고, 시민과 실험하며, 후속 설계에 쓸 근거를 남긴다. 실험 결과를 계획 · 기준 · 인증에 되돌리고, 검증된 거점은 고정시설로 잇는 사업으로 설계한다.

II - 02

대상지 선정 당위성

대상지 선정

시민 접근성 · 가시성 · 안전성 · 활용성 · 상징성 · 사회실험 파급력을 고려해 7개 거점 선정

분야	거점(자치구)	위치	현황 · 문제
안전	약산초(남동구)	약산초 등굣길	아동 · 청소년 생활권 범죄안전 문제 · 어린이 눈높이에 맞춘 등하굣길 안전 강화 필요
안전	선인재단(미추홀구)	제물포역 인근 학교 정문	중 · 고등학교 8개 밀집 · 인천 정신건강 고위험군 학생 3년 연속 증가
포용	송도 캠퍼스타운역 일대(연수구)	연세대 방향 보행로	청년 · 외국인 유동은 많으나 소통 · 교류 콘텐츠 부재
포용	차이나타운(제물포구)	공중화장실 4개소	인천 내 최다 관광객 방문지 · 다국적 방문객 화장실 매너 안내 체계 필요
매력	**굴포천(부평구)**	**제1교량 옆 산책로**	**복원 직후 방문 목적 1위 휴식 35% · 교량 밑 체류 15% · 약 20분 미만 · 그늘 · 자리 부족**
편의	로데오거리(남동구)	로데오 광장	보행자 · 흡연자 혼재 · 꽁초 투기 · 금연구역 단속 7개월 1,387건
편의	연안여객터미널(제물포구)	1층 대기 장소	급격히 몰리는 인파 · 쉬운 길찾기와 짐 정리 문화 필요

II - 02

대상지 선정 당위성

(계속)

실험 방향 · 정책 방향에 맞춰 실증 자료를 축적하며, 1개의 실험은 고정시설로 구현함

방향 01 · 조사②

기존을 실험함 · VERIFY

기존 시설 · 안내 · 공간을 그대로 두고 바뀐 요소만 비교

방향 02 · 조사③

인천 조건에서 실험함 · INCHEON ONLY

통학 · 하천 · 항만 · 상권 등 인천의 생활 조건에서 검증

방향 03 · 조사②

시민이 쓰는 상태로 실험함 · PARTICIPATE

시민디자인단 · 학생 · 작가가 관찰 · 제작 · 평가에 참여

방향 04 · 조사①②

민간과 함께 실험함 · SCALE

3M · 사회적협동조합 · 러닝크루 등 민간 협력 모델의 실물 사례

선정 기준 : 시민 접근성 · 가시성 · 안전성 · 활용성 · 상징성 · 사회실험 파급력. 조사① 정책 여건(3S → 작은 구현 · 시민 참여 · 확산 가능성), 조사② 계획 · 선행연구(재정비 · 후속 설계에 활용할 현장 근거), 조사③ 지역 조건(통학 · 하천 · 항만 · 상권의 실제 이용 조건)을 교차해 거점을 확정했다.

II - 03

3S 전략 · 4개 분야

3S 전략과 4개 분야

지속가능성 · 사회적 가치 · 확산을 기반으로 네 분야의 생활 경험을 구체화

SUSTAINABLE

지속가능성

이해관계자 연결 · 공공 · 민간 협력 · 운영 · 관리의 지속

SOCIAL

사회적 가치

사회문제 대응 · 포용과 접근 · 시민 참여

SCALABLE

확산 · 성장

표준모델 · 매뉴얼 · 다른 생활권 적용 · 사업 연계

Safety

안전

신체적 · 심리적 안전을 고려한 안심하고 이용할 수 있는 도시환경
약산초 · 선인재단

Inclusion

포용

연령 · 국적 · 이용 특성에 관계없이 누구나 참여하고 소통하는 공간
송도 · 차이나타운

Attractiveness

매력

지역의 특성과 다양한 활동이 어우러지는 활력 있고 머물고 싶은 공간
굴포천

Convenience

편의

다양한 이용자의 이동 · 휴식 · 활동을 지원하는 편리하고 쾌적한 공간
로데오거리 · 연안여객터미널

II - 04

사회실험 원칙

사회실험 원칙

같은 측정 체계를 유지하되, 거점별 조건에 맞는 방법으로 변화를 확인함

01

가치중심적 분석

물리적 형태 · 시설물 기능보다 안심 · 이해 · 편안함 · 공존 · 기대 등 이용자의 경험을 중심으로 분석

02

변화하는 요소 구분

그림 · 언어 · 조명 · 그늘 · 사인 · 콘텐츠 중 거점별 여건이나 핵심 방향성에 따라 무엇이 달라졌는지 기록

II - 04

사회실험 원칙

(계속)

03
비교 조건 기록
장소 · 시간 · 날씨 · 운항 · 행사 · 대상 집단의 차이를 함께 기록하여 동일 요소 · 가설별 조건에 따라 비교

04
행동과 의견 기록
설문 · 인터뷰 등 직접적 의사와 이용 · 시선 · 체류 · 이동 등 비언어적 행동 기록을 연결하여 분석

05
근거 기반의 판단
계획값 · 목표값 · 실제 측정값을 구분하여 피드백 및 디자인 보완 시 근거로 활용할 기초 자료 확보

06
운영 · 관리 방안 연결
실험과 검증으로 끝내지 않고 정상 이용 · 설치 안전 · 청결 · 관리 책임을 설계와 함께 검토 · 표준화

기획 → 적용 → 기록 → 해석 → 설계 반영 : 거점별 특성을 반영한 정량 · 정성 분석으로 사회실험 효과 검증

II - 05

사전 기획 과정

사전 기획 과정

시민 의견 · 기관 협의 · 적용 조건을 함께 검토

01 문제 · 대상지 검토
· 생활권 문제와 이용자 경험 정리
· 대상지의 공간 · 이용 조건 검토

02 아이디어 · 실험방향 탐색
· 거점별 디자인 대안 검토
· 시민참여 · 비교 방식 탐색

03 실행계획 구체화
· 1 · 2차 비교 요소와 평가 항목 정리
· 설치 · 운영 · 기록 조건 구체화

흐름 : 생활 문제 → 현장 검토 → 대안 탐색 → 세부 조율(현장 여건 · 관계기관 의견 · 설치 범위 · 참여 방식 · 평가 방법) → 실험 계획

II - 06


사전 현장조사

사전 현장조사

현장사진을 축적하고, 공간과 이용 상태를 확인



굴포천 · 교량 하부의 그늘 · 이용 상태 (위즈플러스 현장조사 2026. 8. 25 · 9. 10)

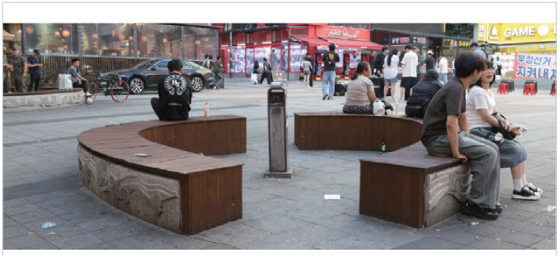

로데오거리 · 벤치 · 보행자 · 흡연공간

II - 06

사전 현장조사

(계속)

조사 방식	내용
관찰 시점	7개 거점 공통 · 평일과 주말, 낮과 밤을 모두 방문해 이용 행태의 시간대별 차이를 확인
기록 항목	조사 일시 · 관찰 구간 · 이용 행태(체류 · 이동 · 시선) · 인터뷰 · 사진
굴포천 결과	그늘 0 · 제1교량이 유일한 그늘, 보행자가 양산을 쓰고 교량 하부로 향함 · 방문 목적 1위 휴식(35%) · 평균 휴식 체류 약 20분

II - 07

현황 종합

현황 종합

공간의 상태와 생활 속 요구를 연결하면, 거점마다 바꾸어야 할 문화가 드러남

거점	이용자 · 공간	현황의 단서	디자인 기회
01 약산초	어린이 · 통학로	언어 · 만남 · 사각지대	쉬운 위치 인지 · 어린이 맞춤 표현
02 선인재단	청소년 · 가로수길	정서 경험 · 머무름	거울 · 색 · 조명 등 심리 안전 요소
03 송도 캠퍼스타운역	외국인 유학생 · 러닝코스	언어와 교류 문턱	직접 교류 · 언어 초월 · 공동 활동
04 차이나타운	외국인 이용자 · 화장실	그림의 의미 해석 차이	권유형 · 금지형의 비교
05 굴포천	**시니어 · 친수**	**그늘 · 자리 · 체류 부족**	**물결그늘 · 머무름 · 참여**
06 로데오거리	흡연자 · 비흡연자 · 가로	분산 흡연과 휴식 혼재	구역 분리 · 시간 정보사인
07 연안여객터미널	승선 이용자 · 1층 대기공간	단조로운 기다림	소리 · 풍경 · 여행 기대

시설과 프로그램은 각 거점의 경험과 문화를 바꾸는 수단 · 거점마다 다른 공간의 맥락과 이용자의 생활 속 요구를 바탕으로 디자인을 통해 새로운 경험, 문화의 장면을 구상

II - 08

컨셉 도출

컨셉 도출 · 인천 도시실험 통합브랜드 「ACT Incheon」

함께 만드는 도시의 변화, 선순환의 인천 · 모든 실험을 감싸는 하나의 공통 언어

A Active
사람들을 움직이게 하는 활력

C Connective
주체들을 단단하게 묶는 연결

T Transformative
도시의 선순환을 만드는 변화

II - 08

컨셉 도출

(계속)

사업을 관통하는 핵심 철학은 거버넌스다. 행정이 제도적 플랫폼을 제공하고, 기업이 재원과 자원을 투입하며, 비영리재단과 시민의 주도적 참여가 실행의 지속성을 견인한다. 인천 도시실험 사업은「ACT Incheon」이라는 하나의 브랜드로 통합하여 추진된다.

7개 거점 분포



1 약산초「살피는 인천」· 2 차이나타운「친절한 인천」· 3 송도 캠퍼스타운역「동행하는 인천」· 4 연안여객터미널「안내하는 인천」· 5 굴포천「만나는 인천」· 6 선인재단「공감하는 인천」· 7 로데오거리「어울리는 인천」

협업 구조 · 다양한 이해관계자와의 협업을 필수 조건으로 함

주체	구성	역할
행정	인천광역시(총괄) · 소관부서 · 군 · 구	대상지 사용허가 · 점용 · 설치 협의 · 안전 · 민원 · 원상복구 · 이관
PM	위즈플러스	총괄기획 · 조정 · 점검 · 관찰 · 기록 · 보고
시민	인천 시민디자인단 · 주민참여위원회 · 송도 러닝크루	문제 발굴 · 생활체감 검증 · 관찰 · 계수 분담 · 설문 · 인터뷰 · 워크숍 참여
예술	청년작가	작품 제공 · 공공미술 · 시민참여 아트 워크숍 진행
현장	약산초 · 인천대 · 송도글로벌캠퍼스	참여형 워크숍 · 운영 거점 제공 · 학생 설문 협조
민간기업	3M	실험 공간구성 재료 부분 지원(바닥시트 · 패브릭 오일 등) · ESG · CSV 연계
사회적협동조합	이소(ISO coop)	제품 제공
자문	전문가 · 관계기관(인천항만공사 · 상인협회)	공공디자인 자문 · 현장 협의

CHAPTER 03

03

거점별 세부계획

SITE EXPERIMENT PLANS

7개 거점의 실험을 한 표로 요약하고, 굴포천 [매력 ⑤] 제1교량 옆 산책로 실험을 거점 개요 · 가설 · 사전기획 · 1차 · 2차 · 설치 품목 · 동일 조건 운영의 순서로 기록한다.

01 전체 실험 요약 · 7개 거점 20

06 굴포천 ① 거점 개요 · 핵심 문제 지표 · 가설 21

굴포천 ② 사전기획과 실험 연결 · 설치 위치 22

굴포천 ③ 1차 실험「흐르는 인천」 23

굴포천 ④ 2차 실험「함께 만드는 인천」 24

굴포천 ⑤ 설치 품목 · 동일 조건 운영 · 안전 기준 25

이 장의 핵심

- 사전조사 → 1차 → 2차 · 교량 하부 대조군
- 체류 인원 · 시간 1.5배, 멈춤률 10% 이상
- 파라솔 8 · 인천대 스툴 · 빈백 16 · 청년작가 2명

III - 01

전체 실험 요약

전체 실험 요약 · 7개 거점

실험적 디자인을 통한 행동 변화와 장소 경험의 전환으로 일상의 문화 확장하기

분야 · 거점	테마	문제 정의	1차	2차	기대효과
안전 ① 약산초 남동구	어린이 맞춤형 안전문화	아동 · 청소년의 생활권 범죄안전 문제	어른이 생각하는 어린이 안전 디자인	어린이가 구상하는 어린이 안전 디자인	심리적 안전감 향상 · 안전 통학문화 형성
안전 ② 선인재단 미추홀구	마음을 돌아보는 등굣길 문화	청소년의 심리적 안정을 위한 통학환경 개선 필요	스티커 설문을 통한 청소년 정서 · 선호도 조사	거울나무 · 긍정 문구를 통한 정서안정 효과	청소년 참여형 디자인의 자기인식 · 정서안정 효과 검증
포용 ③ 송도 캠퍼스타운역 연수구	소속감을 높이는 러닝문화	외국인 유학생의 운동 진입장벽과 생활권 교류 기회 부족	영문 중심 보도블록 안내의 정보 전달 효과	픽토그램 중심 보도블록 안내의 정보 전달 효과	안내 방식에 따른 경로 이해도 및 참여 효과 비교
포용 ④ 차이나타운 제물포구	올바른 공공화장실 이용 문화	외국인 · 관광객의 언어 · 문화 차이를 극복하는 안내체계 필요	금지형 픽토그램의 1컷 · 3컷 효과 비교	권유형 픽토그램의 1컷 · 3컷 효과 비교	일반형 · 단계별 픽토그램 비교를 통한 효과적인 안내 방식 확산
매력 ⑤ 굴포천 부평구	**함께 만들고 머무는 친수공간 이용 문화**	**하천공간의 체류 · 감각 경험 부족과 장소매력 저하**	**그늘막 · 휴게공간 설치에 따른 체류 변화**	**시민참여형 휴게공간 조성에 따른 휴게환경 변화**	**시민참여에 따른 공간 이용 효과 검증**
편의 ⑥ 로데오거리 남동구	흡연자와 비흡연자가 공존하는 거리 문화	무분별한 흡연과 간접흡연 방지를 위한 공간 개선 필요	흡연 · 비흡연 공간 분리에 따른 이용행태	유도 사이니지 설치에 따른 흡연행태 변화	공간 분리와 안내 디자인의 흡연행태 개선 효과 검증
편의 ⑦ 연안여객터미널 제물포구	길찾기부터 짐 정리까지 편리한 대기 문화	복잡한 동선으로 목적지 · 편의시설을 찾기 어렵고 짐 정리 공간 부족	통합 안내사인 설치를 통한 길찾기 효과 검증	안내사인 유지 + 짐 보관 · 정리 공간 추가에 따른 이용 편의 변화	이용자 중심 길찾기 표준디자인

1차 · 2차 비교 유형 · 확인할 변화

거점	비교 유형	확인할 변화	실험 결과물
약산초	디자인 주체 · 장소 선택	시설 인지 · 위치 정답률 · 위치 설명	어린이 참여형 안전시설물 표준디자인
선인재단	요소 탐색 → 선별 · 통합	응답 · 선호 · 설치 후 반응	청소년 정서안정 공공디자인
송도	정보 · 활동의 추가	의미 이해 · 공간 이용 · 인사와 대화	외국인 친화형 보행안내 표준디자인
차이나타운	표현 방식의 비교	의미 해석 · 경각심 · 개선 의견	다문화 공공화장실 에티켓 픽토그램
굴포천	**공간 → 참여 활동**	**체류 · 참여 · 장소 인식**	**시민수요 대응형 공공공간 표준디자인**
로데오거리	구역 → 이동 안내	공간 인지 · 이용 · 이동 행동	흡연 · 비흡연 공존형 공간 표준디자인
연안여객터미널	정보 · 공간의 연계	쉬운 길찾기 · 짐 보관의 정돈 정도	공간 특성 · 이용자 중심 길찾기 표준디자인

안전 계획(공통) : 1. 대상지별 최소 3명 이상의 안전요원 배치 · 2. 당일 설치 / 철수 원칙 · 같은 조건 · 달라진 요소 · 대상 · 시간의 차이를 함께 기록

III - 01
전체 실험 요약
(계속)

III - 06
거점별 세부 계획

매력 ⑤
굴포천
[제1교량 옆 산책로]
부평구 부평동 88-5 일원

굴포천 ① 거점 개요 · 핵심 문제 지표 · 가설

굴포천 산책로 위에 파라솔 그늘막과 머무름 자리를 두어 그늘 · 휴게 개입이 친수공간의 체류 · 이용행태에 미치는 영향을 비교 · 검증

핵심 문제 지표 · [매력] 친수공간 체류

휴식 35%
방문 목적 1위는「휴식」이나 그늘도 앉을 자리도 없음
위즈플러스 현장조사 · 보행자 설문 2026. 8. 25

그늘 0
제1교량이 유일한 그늘 · 보행자가 양산을 쓰고 교량 하부로 향함
위즈플러스 현장조사 2026. 8. 25 · 9. 10

20분
교량 하부(유일한 그늘)를 그냥 지나감 · 머무는 사람은 콘크리트 그늘에 집중 · 평균 휴식 체류 약 20분
위즈플러스 현장조사 · 보행자 설문 2026. 8. 25

볼게 없음
「생태하천이라고 대대적으로 홍보했지만 풀도 없고 생태가 살아난 느낌이 들지 않아요」· 출근길 산책 주민
중부일보 2026. 5. 21

1차 실험「흐르는 인천」 하드웨어 · 파라솔 + 스툴 · 빈백 · 책 · 소리 · 향으로 그늘 · 자리 제공

1차 가설
이미 그늘인 교량 하부 말고 햇빛 산책로에 파라솔 그늘과 스툴 · 책 · 소리 · 향이 있으면, 지나치던 사람이 그늘을 골라 머물게 되지 않을까?

1차 실험 설계 핵심
교량 양쪽 파라솔 8개(4+4) · 인천대 아트 의자 · 파라솔 아래 빈백 16 · 책 · 소리 · 향 · 반대쪽 산책로 · 교량 하부는 대조군

근거 · Lin, Matzarakis & Hwang(2010) 옥외 열쾌적성 연구에서 그늘의 유무가 체류 의사를 가르는 가장 큰 요인 · Whyte(1980) 도시 소공간에서 사람은 앉을 자리와 그늘이 있는 곳에 머문다

2차 실험「함께 만드는 인천」 소프트웨어 · 1차 시설물 그대로 + 청년작가 · 시민 스툴 꾸미기 워크숍

2차 가설
1차 시설물은 그대로 두고 청년작가와 시민이 스툴을 함께 꾸미면, 지나치던 사람이 더 오래 머물고「내 자리」로 느끼지 않을까?

2차 실험 설계 핵심
청년작가 2명 + 시민 + 인천대 아트 의자 · 스툴 30~40개 꾸미기(그림 · 패턴 · 테이프) · 꾸민 스툴 바로 배치 · 잴 것 : 참여 인원 · 재방문 · 1차 대비 체류

근거 · Mehta(2007), Journal of Planning Education and Research : 앉을 자리 · 활동 · 사회적 요소가 있는 거리에서 체류 시간이 길어짐 · 참여가 장소 애착을 높임

III - 06

거점별 세부 계획

(계속)

매력 ⑤

굴포천

[제1교량 옆 산책로]
부평구 부평동 88-5 일원

비교 구조 · 같은 산책로, 같은 시간대, 세 구간 동시 계수

실험군	대조군 ①	대조군 ②
설치측 산책로	**교량 하부**	**반대쪽 산책로**
파라솔 8 · 스툴 · 빈백 · 책 · 소리 · 향	기존 그늘 · 콘크리트 · 시설 없음	햇빛 · 설치 없음

지표	사전조사(10.17)	1차(11.15~16)	2차(11.22)
체류 인원 · 시간	기준값 · 세 구간	실험군 ≥ 교량 하부 × 1.5	1차 대비 변화율
멈춤률	기준값	10% 이상	참여 전 · 중 · 후
정성	보행자 설문	그늘 체감 · 머무는 이유	참여 인원 · 재방문 · 「내 자리」 인터뷰

굴포천 ② 사전기획과 실험 연결 · 설치 위치

교량 하부의 쉼을 검토한 뒤, 오감 + 아트 콘셉트로 1차 하드웨어 · 2차 시민 참여 아트로 구체화함

사전기획 · 2026. 09. 09 | 세부 조율 · 2026. 10. 01 | 실행계획 구체화 · 10. 19 ~ 11. 4



교량 하부의 오감 쉼터

작가 전시 → 빈백 · 책을 더한 쉼

그늘과 시민 제작으로 조정


햇빛 산책로 그늘막 · 작가 수업 → 시민 조각 전시

1차 하드웨어 → 2차 시민 참여 아트

파라솔 · 스툴 · 소리 · 향 → 청년작가 · 시민 꾸미기

조율 포인트 : 현장 여건 · 그늘 적용 범위 조율(인천시 · 부평구) → 참여 주체 · 제작 · 운영 방식 조율(인천대 · 청년작가)

1차 「흐르는 인천」



- 파라솔 8 + 스툴 · 빈백 · 책 · 소리 · 향
- 운영 11.15(일) ~ 16(월)
- 동일 시간대 동시 계수 · 체류 인원 · 시간 · 멈춤률

2차 「함께 만드는 인천」



- 청년작가 2명 + 시민(인천대 아트 의자 활용)
- 인천대 스툴 30~40개 꾸미기 · 그림 · 패턴 · 색 테이프
- 참여 · 체류 · 재방문 계수 · 시민 · 작가 인터뷰 · 학생 사전 · 사후 설문

대여(파라솔 8 · 빈백 16 · 매트 16) · 인천대 스툴(~11.14 제작) · 고정 설치 없음 · 야간 빈백 회수

III - 06

거점별
세부 계획

(계속)


매력 ⑤

굴포천

[제1교량 옆 산책로]
부평구 부평동 88-5 일원

설치 위치 · 인천 부평구 부평동 88-5 일원 · 굴포천 제1교량(부흥교) 옆 산책로



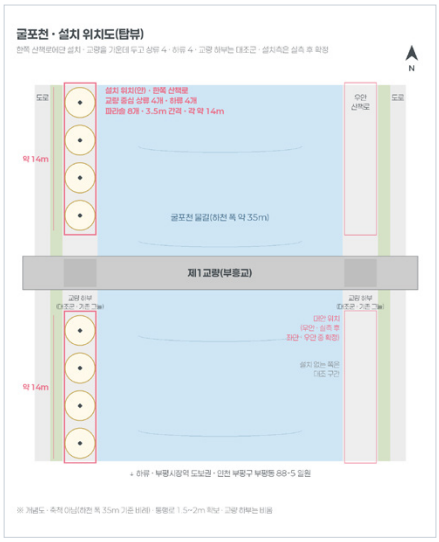


한쪽 산책로 · 교량을 가운데 두고 상류 4 · 하류 4 파라솔 8개(3.5m 간격 · 각 약 14m) · 반대쪽 산책로 · 교량 하부는 대조군 · 부평시장역 도보권 · 교량 하부 체험프로그램 연계

굴포천 ③ 1차 실험「흐르는 인천」

하드웨어 · 파라솔 8 + 인천대 스툴 · 빈백 · 책 · 소리 · 향으로 그늘 · 자리 제공 · 11.15(일) ~ 16(월)



1차 설치 시뮬레이션 · 햇빛 산책로의 파라솔 그늘과 빈백 · 스툴

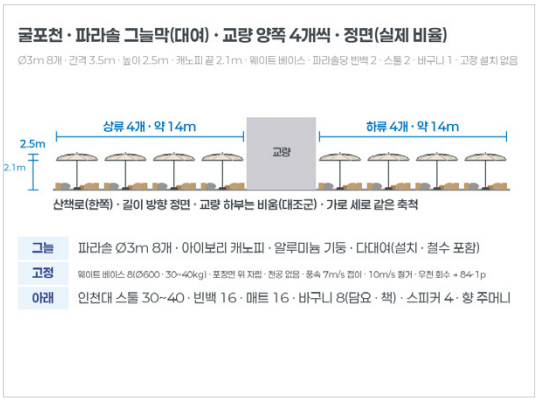

정면(실제 비율) · Ø3m 파라솔 · 교량 양쪽 4개씩 · 높이 2.5m

실험 세부 설계

1. **[실험 가설]** 햇빛 산책로에 파라솔 그늘 · 스툴 · 책 · 소리 · 향이 있으면, 지나치던 사람이 그늘을 골라 머물게 되지 않을까?

2. **[실험 대상]** 산책로 이용자(보행 · 러닝 · 시니어) · 대조군 : 교량 하부 체류자

3. **[실험 방법]** 정량 - (계수) 체류 인원 · 시간 · 멈춤률(교량 하부와 동시) · 정성 - (인터뷰) 그늘 체감 · 머무는 이유 · 「쉬어 가는 곳」

4. **[목표 데이터]** 그늘 아래 체류 인원 · 시간이 교량 하부 대비 1.5배 · 멈춤률 10% 이상

III - 06

거점별 세부 계획

(계속)

매력 ⑤

굴포천

[제1교량 옆 산책로]
부평구 부평동 88-5 일원

실험 일정

구분	일정 · 조건
실험 운영 기간	(1차) 26년 11월 15일(일) ~ 16일(월) 설치 · 관찰 (2차) 26년 11월 22일(일) 13~15시 청년작가 · 시민 워크숍 (참여) 인천대 학생 · 11.10 설명 · 제작 · 1 · 2차 참여 · 11.26 시청 전시
시설물 유지 기간	(1차) 11.15 설치 ~ 11.16 회수 · 야간 빈백 회수 · 고정 설치 없음 (2차) 11.22 설치 · 당일 회수
데이터 수집 · 선정 근거	1차 2일 · 2차 1일 · 오전 · 오후 각 1시간 · 관찰 3인 이내 10.17(토) 사전조사와 같은 시간대 · 교량 하부(대조군)와 동시 계수

관계기관

구분	역할
관계부서	인천시 · 부평구 — 공문 · 설문 · 장소 협의 · 산책로 임시 점용
인천대 · 학생	인천대 4팀 · 청년작가 2명 — 스툴 제작(~11.14) · 당번 · 2차 워크숍
시민디자인단	두 그늘 계수 분담 · 사전 · 사후 인식조사

굴포천 ④ 2차 실험「함께 만드는 인천」

소프트웨어 · 1차 시설물 그대로 + 청년작가 · 시민 스툴 꾸미기 워크숍 · 11.22(일) 13~15시



교량 하부 워크숍 · 청년작가 2명 · 시민 · 인천대 4팀 · 스툴 30~40개 꾸미기



배치 개념도(탑뷰) · 교량 양쪽 파라솔 4개씩 · 설치측 산책로

실험 세부 설계

1 **[실험 가설]** 1차 시설물을 그대로 두고 청년작가와 시민이 스툴을 함께 꾸미면, 참여한 사람과 지나치던 사람이 더 오래 머물고「내 자리」로 느끼지 않을까?

2 **[실험 대상]** 청년작가 2명 · 시민 · 산책로 이용자 · 인천대 4팀 · 대조군 : 1차 결과

3 **[실험 방법]** 정량 - 참여 인원 · 꾸민 스툴 수 · 행사 전 · 중 · 후 체류(1차 대비) · 정성 - 시민 · 작가 인터뷰 · 학생 사전 · 사후 설문 · 부평구 의견

4 **[목표 데이터]** 같은 하드웨어에 시민 참여 프로그램을 더한 체류 변화율 측정

III - 06

거점별
세부 계획

(계속)

매력 ⑤

굴포천

[제1교량 옆 산책로]
부평구 부평동 88-5 일원

워크숍 배치 · 교량 양쪽 파라솔 아래(탑뷰)

A
꾸미기 작업대
상류 파라솔 4 아래 · 팀 A

B
꾸민 스툴 배치
하류 파라솔 4 아래 · 팀 B

C
재료 · 전시
교량 하부 · 조각 걸이

D
안내 · 접수 · 기록
양쪽 입구



인천대 스툴(1차 설치) · 2차 꾸미기 대상

· 이중 골판지 스툴 400×400×420 내외 · 30~40개
· 하중 시험 · 방수 후 1차 설치 · 2차에 그림 · 패턴 · 색테이프로 꾸밈
· 꾸민 스툴은 바로 하류 파라솔 아래 배치 → 「내 자리」 경험
· 참여 학생 사전 · 사후 설문 · 11.26 시청 전시로 연결

2차 실험 프로그램 흐름 · 11.22(일)

12:30 설치 점검
1차 시설물 상태 · 재료 배치

→

13:00 접수 · 안내
D 구역 · 참여자 기록

→

13:10 꾸미기
A 구역 · 작가 지도 · 4팀

→

14:20 배치 · 전시
B · C 구역 · 꾸민 스툴 배치

→

15:00 인터뷰 · 설문
시민 · 작가 · 학생 사후 설문

→

~17:00 관찰 · 계수
행사 후 체류 · 1차 대비

굴포천 ⑤ 설치 품목 · 동일 조건 운영 · 안전 기준

규격 · 재질 · 수량 · 대여품(파라솔 · 빈백 · 매트) · 인천대 스툴 · 자체 조달 · 고정 설치 없음

설치 품목	사이즈(mm)	재질	수량	비고
대형 파라솔(원형 폴딩)	Ø3,000 · H2,400 이상	폴리에스터 캐노피 · 알루미늄 기둥	8개	대여
파라솔 웨이트 베이스	Ø600 내외	주철 · 물주입 PE	8개	대여
모래주머니(강풍 대비)	10kg	PE 직포 · 모래	16개	자체
대형 빈백	1,200×1,000×700	방수 패브릭 · EPS 충전	16개	대여
빈백용 매트	1,600×1,800	파이텍스	16장	대여
담요 · 책 바구니	Ø450 · H350	라탄(등나무)	8개	자체
무릎담요	1,000×1,400	플리스	16~24장	자체
도서	문고 · 그림책 · 잡지	-	40~50권	도서관 협의
향 주머니	100×120	린넨 · 말린 재료	8~16개	자체
소형 블루투스 스피커	Ø80 내외	ABS · 충전 배터리	4개	자체
실험 안내 입간판	W350×D400×H750	철제	2개	자체
계수 · 설문 기록판	A3 클립보드	-	3개	자체
인천대 스툴 · 벤치(1차)	스툴 400×400×420 내외	이중 골판지	30~40개	인천대 제작 · 2차 꾸미기

III - 06

거점별 세부 계획

(계속)

매력 ⑤

굴포천

[제1교량 옆 산책로]
부평구 부평동 88-5 일원

동일 조건 운영 · 현장조사 → 사전조사 → 1차 → 2차

요일 · 시간대

10.17(토) 사전조사와 같은 요일 유형(주말) · 오전 · 오후 각 1시간 동일 시간대

관찰 구간

설치측 산책로(파라솔 8) + 교량 하부(대조군) + 반대쪽 산책로 · 동시 계수

관찰 인원 · 방법

관찰 3인 이내 · 시민디자인단 두 그늘 계수 분담 · 같은 기록판 · 같은 지표

기록 조건

날씨 · 기온 · 행사 · 대상 집단을 함께 기록 · 계획값 · 목표값 · 측정값 구분

일정 요약

단계	일자	요일	시간	내용
현장조사	8.25 · 9.10	화 · 수 + 주말	낮 · 밤	전수 관찰 · 보행자 설문 · 사진
사전조사	10.17	토	오전 · 오후 각 1시간	기준값 계수 · 교량 하부 동시
1차 실험	11.15 ~ 16	일 · 월	사전조사와 동일 시간대	파라솔 8 · 빈백 · 책 · 소리 · 향
2차 실험	11.22	일	13 ~ 15시 워크숍 + 동일 시간대 계수	스툴 꾸미기 · 참여 · 체류 · 재방문

안전 · 고정 · 철수 기준(전문위원 의견 반영)

· 파라솔 웨이트 베이스(Ø600 · 30~40kg) + 모래주머니 10kg으로 고정 · 포장면 위 자립 · 천공 없음
· 풍속 7m/s 접이 · 10m/s 철수 · 우천 시 회수 · 야간 빈백 · 담요 · 책 회수(고정 설치 없음)
· 좌석 안전 : 스툴 하중 시험 · 방수 처리 후 설치 · 산책로 통행폭 1.5~2m 확보 · 안전요원 3명 이상 · 당일 설치 · 철수 원칙

CHAPTER 04

04

향후계획

NEXT STEPS

실험 결과를 계획값 · 목표값 · 측정값으로 구분해 기록하고, 운영 · 종료 후 판단 · 표준 매뉴얼로 다음 설계와 운영에 연결한다.

01 운영 · 일정 · 조건 관리 28

02 운영 절차 · 종료 후 판단 29

03 사회실험 표준 매뉴얼 29

참고 자료 · 국내외 보고서 · 문헌 30

이 장의 핵심


- ACT WEEK · 거점별 운영 기간과 데이터 수집일
- 설치 전 · 운영 중 · 종료 후 실행표
- 기획 · 설계 · 운영 · 관리 4편의 표준모델

IV - 01

운영 · 일정 · 조건 관리

향후계획 · 운영 · 일정 · 조건 관리

시민과 함께 실험하고, 관찰한 근거를 다음 설계로 연결함 · ACT WEEK

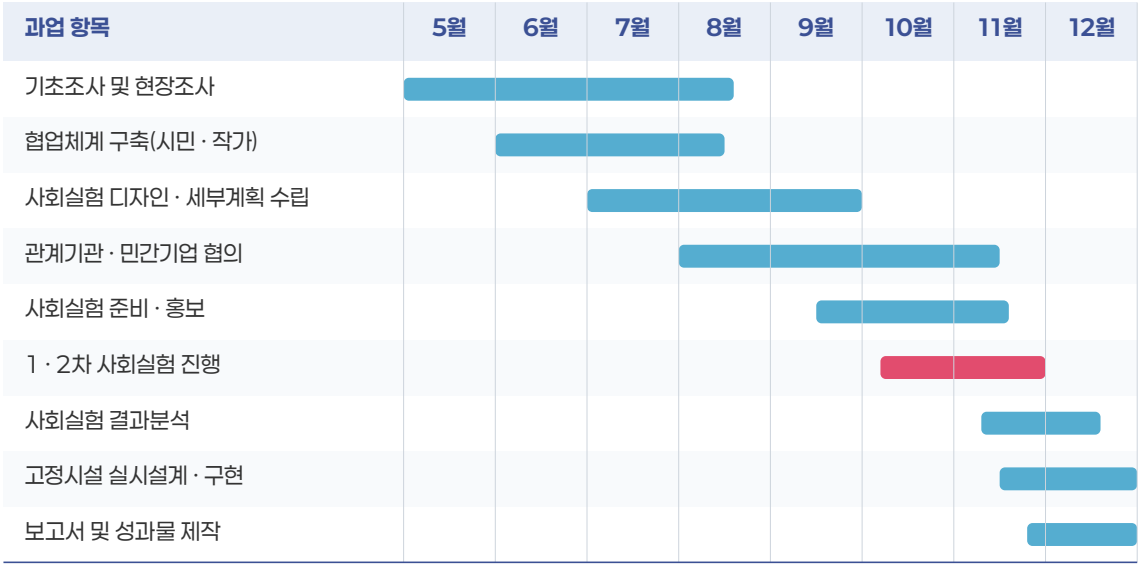

5월 과업 착수 · 착수보고회 **6월** 포럼 개최 **9월** 1차 중간보고 **10~11월** 공공디자인 심의 · 2차 중간보고 **12월** 최종보고

거점별 운영 기간 · 데이터 수집일 (선정 근거 : 유동인구 최다 요일 · 주중 1일 · 주말 1일 지정 · 사전조사

거점	1차	2차	운영 조건 · 근거
[안전] 약산초(완료)	10.20 ~ 22	11.03 ~ 05	각 평일 등교 3일 · 동일 시간대 스티커 설문
[안전] 선인재단	11.09 ~ 11	11.16 ~ 18	등교 동선 · 시간이 일정 · 평일 3일 집중
[포용] 송도 캠퍼스타운역	11.20	11.21	송도 러닝크루 정기 러닝 일정 협의(예외)
[포용] 차이나타운(완료)	11.05	11.06	차수별 별도 참여자 50명 · 동일 조사 조건
[매력] 굴포천	**11.15 ~ 16**	**11.22**	**사전조사(10.17)와 동일 시간대 · 교량 하부 대조군 동시 계수**
[편의] 로데오거리	11.15 ~ 16	11.20 ~ 21	유동인구 최다 요일 · 주중 1 · 주말 1
[편의] 연안여객터미널	11.11 ~ 12	11.13 ~ 14	운항 시간 · 동일 대기 시간대

IV - 02

운영 절차 · 종료 후 판단

운영 절차 · 종료 후 판단

설치 전 · 운영 중 · 종료 후의 연결 — 현장 실행표를 중심으로 설치 · 기록 · 정비 · 이관을 한 흐름으로 관리

시점	실행 항목	남길 자료
설치 전	장소 · 관리기관 협의, 설치도 · 동선 · 시설 상태 확인	설치 위치도 · 시작 점검표 · 전후 사진
운영 중	참여 안내, 관찰 · 설문, 고장 · 불편 · 조건 변경 대응	관찰표 · 의견 기록 · 운영일지 · 변경 대장
종료 후	철거 · 원상정비 또는 존치, 보수 · 인계 내용 정리	종료 사진 · 정비 목록 · 인수인계 자료

철거 · 원상 정비

임시물 · 장비 부착물 회수 · 설치 전후 상태 확인

존치 및 관리

존치 대상 · 관리 주체 · 정비 조건 검토 · 현장 점검 · 인계

고정 구현 검토

효과 · 이용 · 관리 가능성 검토 · 최종 설계 · 심의 · 이관 협의

현장 상태 · 실험 성과 · 기관 협의 결과를 종합하여 철거 · 존치 · 고정 구현의 합리적인 후속 방향 설정. 실험 결과 → 설계 보완 → 고정 구현 판단 → 운영 · 관리 매뉴얼.

)

IV - 03

사회실험 표준 매뉴얼

사회실험 표준 매뉴얼

기획 · 설계 · 운영 · 관리, 네 편의 표준모델 — 자치구 및 타 지자체가 활용할 수 있는 지침

PART 01
기획하기

사회문제 진단 · 거점 선정 기준 · 가설 설정 · 협업 구조

PART 02
설계하기

최종 도면 · 재료 · 색 · 그림 · 안내 · 현장 적용 조건 · 변경 이력

PART 03
운영하기

실험 실행 절차 · 참여 프로그램 · 관찰 · 설문 양식 · 성과 측정

PART 04
관리하기

유지관리 체크리스트 · 콘텐츠 갱신 · 파손 · 고장 대응 · 인수인계

제공 형태 : 디지털 파일(검색 가능한 PDF · 편집 원본 · 양식) + 책자 매뉴얼(핵심 지침 · 현장 체크표 · 관리 연락체계) · 실험 결과 → 설계 보완 → 고정 구현 판단 → 운영 · 관리 매뉴얼

참고
자료

참고 자료 · 국내외 보고서 · 문헌

본 보고서의 구성과 지표 체계는 아래 임시 설치 · 시범사업 평가보고서를 참고해 정리함

국외 · 시범사업(Pilot · Tactical Urbanism) 평가보고서

City of Los Angeles · People St

People St Project Evaluation Manual — 플라자 · 파클렛 시범사업의 전 · 후 평가 항목(이용 인원 · 체류 · 활동 · 만족), 관찰 계수표와 설문 양식, 영구화 판단 기준

New Jersey Bicycle & Pedestrian Resource Center

Evaluating Tactical Urbanism (2019) — 임시 설치 사업의 평가 설계 : 사전 · 사후 비교, 대조 구간, 정량(계수 · 속도 · 체류) + 정성(인터뷰) 병행

Waka Kotahi NZ Transport Agency

Innovating Streets for People · Programme Evaluation (2020/21) — 시범 설치 거점별 1쪽 요약, KPI(이용 · 안전 · 체감), 커뮤니티 참여 · 운영 기록 체계

Broward MPO · SUTP

#BTactical Tactical Urbanism Guide · SUTP Tactical Urbanism Pilot — 가역적 설치 · 당일 설치 철수 · 안전 요원 배치 · 기상 대응 등 운영 체크리스트

국내 · 정책 · 연구

인천광역시

인천 창의디자인 사회실험 사업 심의도서(2026. 11) · 공공디자인 진흥계획 · 인천형 창의디자인 3S 전략

인천연구원

사회실험 5단계 방법 프로세스(기획 → 적용 → 기록 → 해석 → 설계 반영)

서울특별시 디자인정책관

디자인거버넌스 · 생활안심디자인 사회실험 성과보고 및 간행물 — 시민 참여형 공공디자인 실험 · 평가 체계

위즈플러스

7개 거점 현장조사(2026. 8 ~ 9) · 보행자 설문 · 사전기획 · 실험 세부계획 · 설치 품목표 · 동일 조건 운영 계획(2026. 11)

학술 문헌 · 굴포천 가설 근거

- Whyte, W. H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. — 도시 소공간에서 사람은 앉을 자리와 그늘이 있는 곳에 머문다.
- Lin, T.-P., Matzarakis, A., & Hwang, R.-L. (2010). Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment. — 그늘의 유무가 체류 의사를 가르는 가장 큰 요인.
- Mehta, V. (2007). Lively Streets: Determining Environmental Characteristics to Support Social Behavior. Journal of Planning Education and Research. — 앉을 자리 · 활동 · 사회적 요소가 있는 거리에서 체류 시간이 길어짐.
- 중부일보 (2026. 5. 21). 굴포천 생태하천 복원 관련 보도 —「볼게 없음」 주민 의견.

작성 안내

· 본 문서는 보고서 포맷 초안으로, 심의도서의 앞단(I · II)과 굴포천 1개 거점을 A4로 재구성한 것이다. 나머지 6개 거점은 같은 구성(개요 · 사전기획 연결 · 1차 · 2차 · 품목 · 운영)으로 확장할 수 있다.
· 실험 결과(측정값 · 사진 · 인터뷰)는 1 · 2차 종료 후 각 거점 ③ · ④ 쪽과 IV장에 추가한다. 수치는 계획값 · 목표값 · 측정값을 구분해 기록한다.
